

| Nr. | | Vorgang | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen | 2022 | | | | | 1. Qtl, 2023 | | | 2. Qtl, 2023 | | | 3. Qtl, 2023 | | | 4. Qtl, 2023 | | | 1. Qtl, 2024 | | | | | |
|-----|--|---------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | | | | |
| 1 | | | Prüfung Statk | 30 Tage | Don 11.08.22 | Mit 21.09.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Baubeginn BA1 | 320 Tage? | Mit 14.09.22 | Die 05.12.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Baustelleneinrichtung | 58 Tage | Mit 14.09.22 | Fre 02.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Bauzaun, Baustrom/-Wasser, Bau WC | 16 Tage | Mit 14.09.22 | Mit 05.10.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Gerüstbau | 14 Tage | Die 15.11.22 | Fre 02.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Abrüsten | 4 Tage | Die 13.06.23 | Fre 16.06.23 | 34EA+5 Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Rohbau | 286 Tage | Die 01.11.22 | Die 05.12.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Rückbau / Entkernung | 30 Tage | Die 01.11.22 | Mon 12.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Rückbauarbeiten: Bodenbeläge, Wandbeläge, Einbauten, Türen etc. | 5 Tage | Die 01.11.22 | Mon 07.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Abbrucharbeiten | 25 Tage | Die 08.11.22 | Mon 12.12.22 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Maurer- / Betonbau | 230 Tage | Don 08.12.22 | Mit 25.10.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Punkt- und Streifenfundamente Nachgründungen, Abfangungsmaßnahmen Saal, Anpassung Grundleitungen, Neuaufbau Sohle Kita, Fassadenpfeiler Kita | 100 Tage | Don 08.12.22 | Mit 26.04.23 | 8EA-3 Tage;36EA-Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Trocknungszeit Sohlplatte BA1 Kita | 26 Tage | Mon 06.02.23 | Mon 13.03.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Rückbau und Neuaufbau Sohlplatten Saal und Bar, | 60 Tage | Don 27.04.23 | Mit 19.07.23 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Ausführung Aufzugsschacht | 12 Tage | Mon 13.02.23 | Die 28.02.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Trocknungszeit Sohlplatte BA2 | 22 Tage | Don 20.04.23 | Fre 19.05.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | Türdurchbrüche, Grundrissänderung | 25 Tage | Don 20.07.23 | Mit 23.08.23 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | Neuerstellung Treppe HM 1.OG | 25 Tage | Don 24.08.23 | Mit 27.09.23 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | Fassadenreparatur, Mauerwerksaustausch | 20 Tage | Don 28.09.23 | Mit 25.10.23 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | Bauwerksabdichtung | 102 Tage | Mon 03.04.23 | Die 22.08.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | Horizontalsperren | 10 Tage | Fre 26.05.23 | Don 08.06.23 | 16EA+4 Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | Sanierputz nur BA2 | 14 Tage | Don 03.08.23 | Die 22.08.23 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | Dichtschlämme Außen | 10 Tage | Mon 03.04.23 | Fre 14.04.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | Dämmarbeiten Außenwände | 97 Tage | Mit 05.04.23 | Don 17.08.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | Innendämmung Außenwände | 97 Tage | Mit 05.04.23 | Don 17.08.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | Wandvorbereitung und Innendämmung BA1 Kita | 27 Tage | Mit 05.04.23 | Don 11.05.23 | 31EA-10 Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | Wandvorbereitung und Innendämmung BA2 | 70 Tage | Fre 12.05.23 | Don 17.08.23 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | WDVS Anbau WC | 21 Tage | Die 16.05.23 | Die 13.06.23 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | Ausblasdämmung | 8 Tage | Die 18.04.23 | Don 27.04.23 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | Dachdeckerarbeiten | 91 Tage | Fre 14.04.23 | Fre 18.08.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | Abdichtung Sohlplatten BA 1 Krippe | 3 Tage | Fre 14.04.23 | Die 18.04.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Abdichtung Sohlplatten BA 2 | 8 Tage | Mon 22.05.23 | Mit 31.05.23 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | Dachsanierung WC-Anbau | 21 Tage | Mon 17.04.23 | Mon 15.05.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: 303_BiM_Terminplan
Datum: Don 30.03.23

Vorgang



Projektsammelvorgang



Manueller Vorgang



Nur Anfang



Stichtag



Unterbrechung



Inaktiver Vorgang



Nur Dauer



Nur Ende



In Arbeit



Meilenstein



Inaktiver Meilenstein



Manueller Sammelrollup



Externe Vorgänge



Manueller Fortschritt



Sammelvorgang



Inaktiver Sammelvorgang






























































Manueller Sammelvorgang




Externer Meilenstein








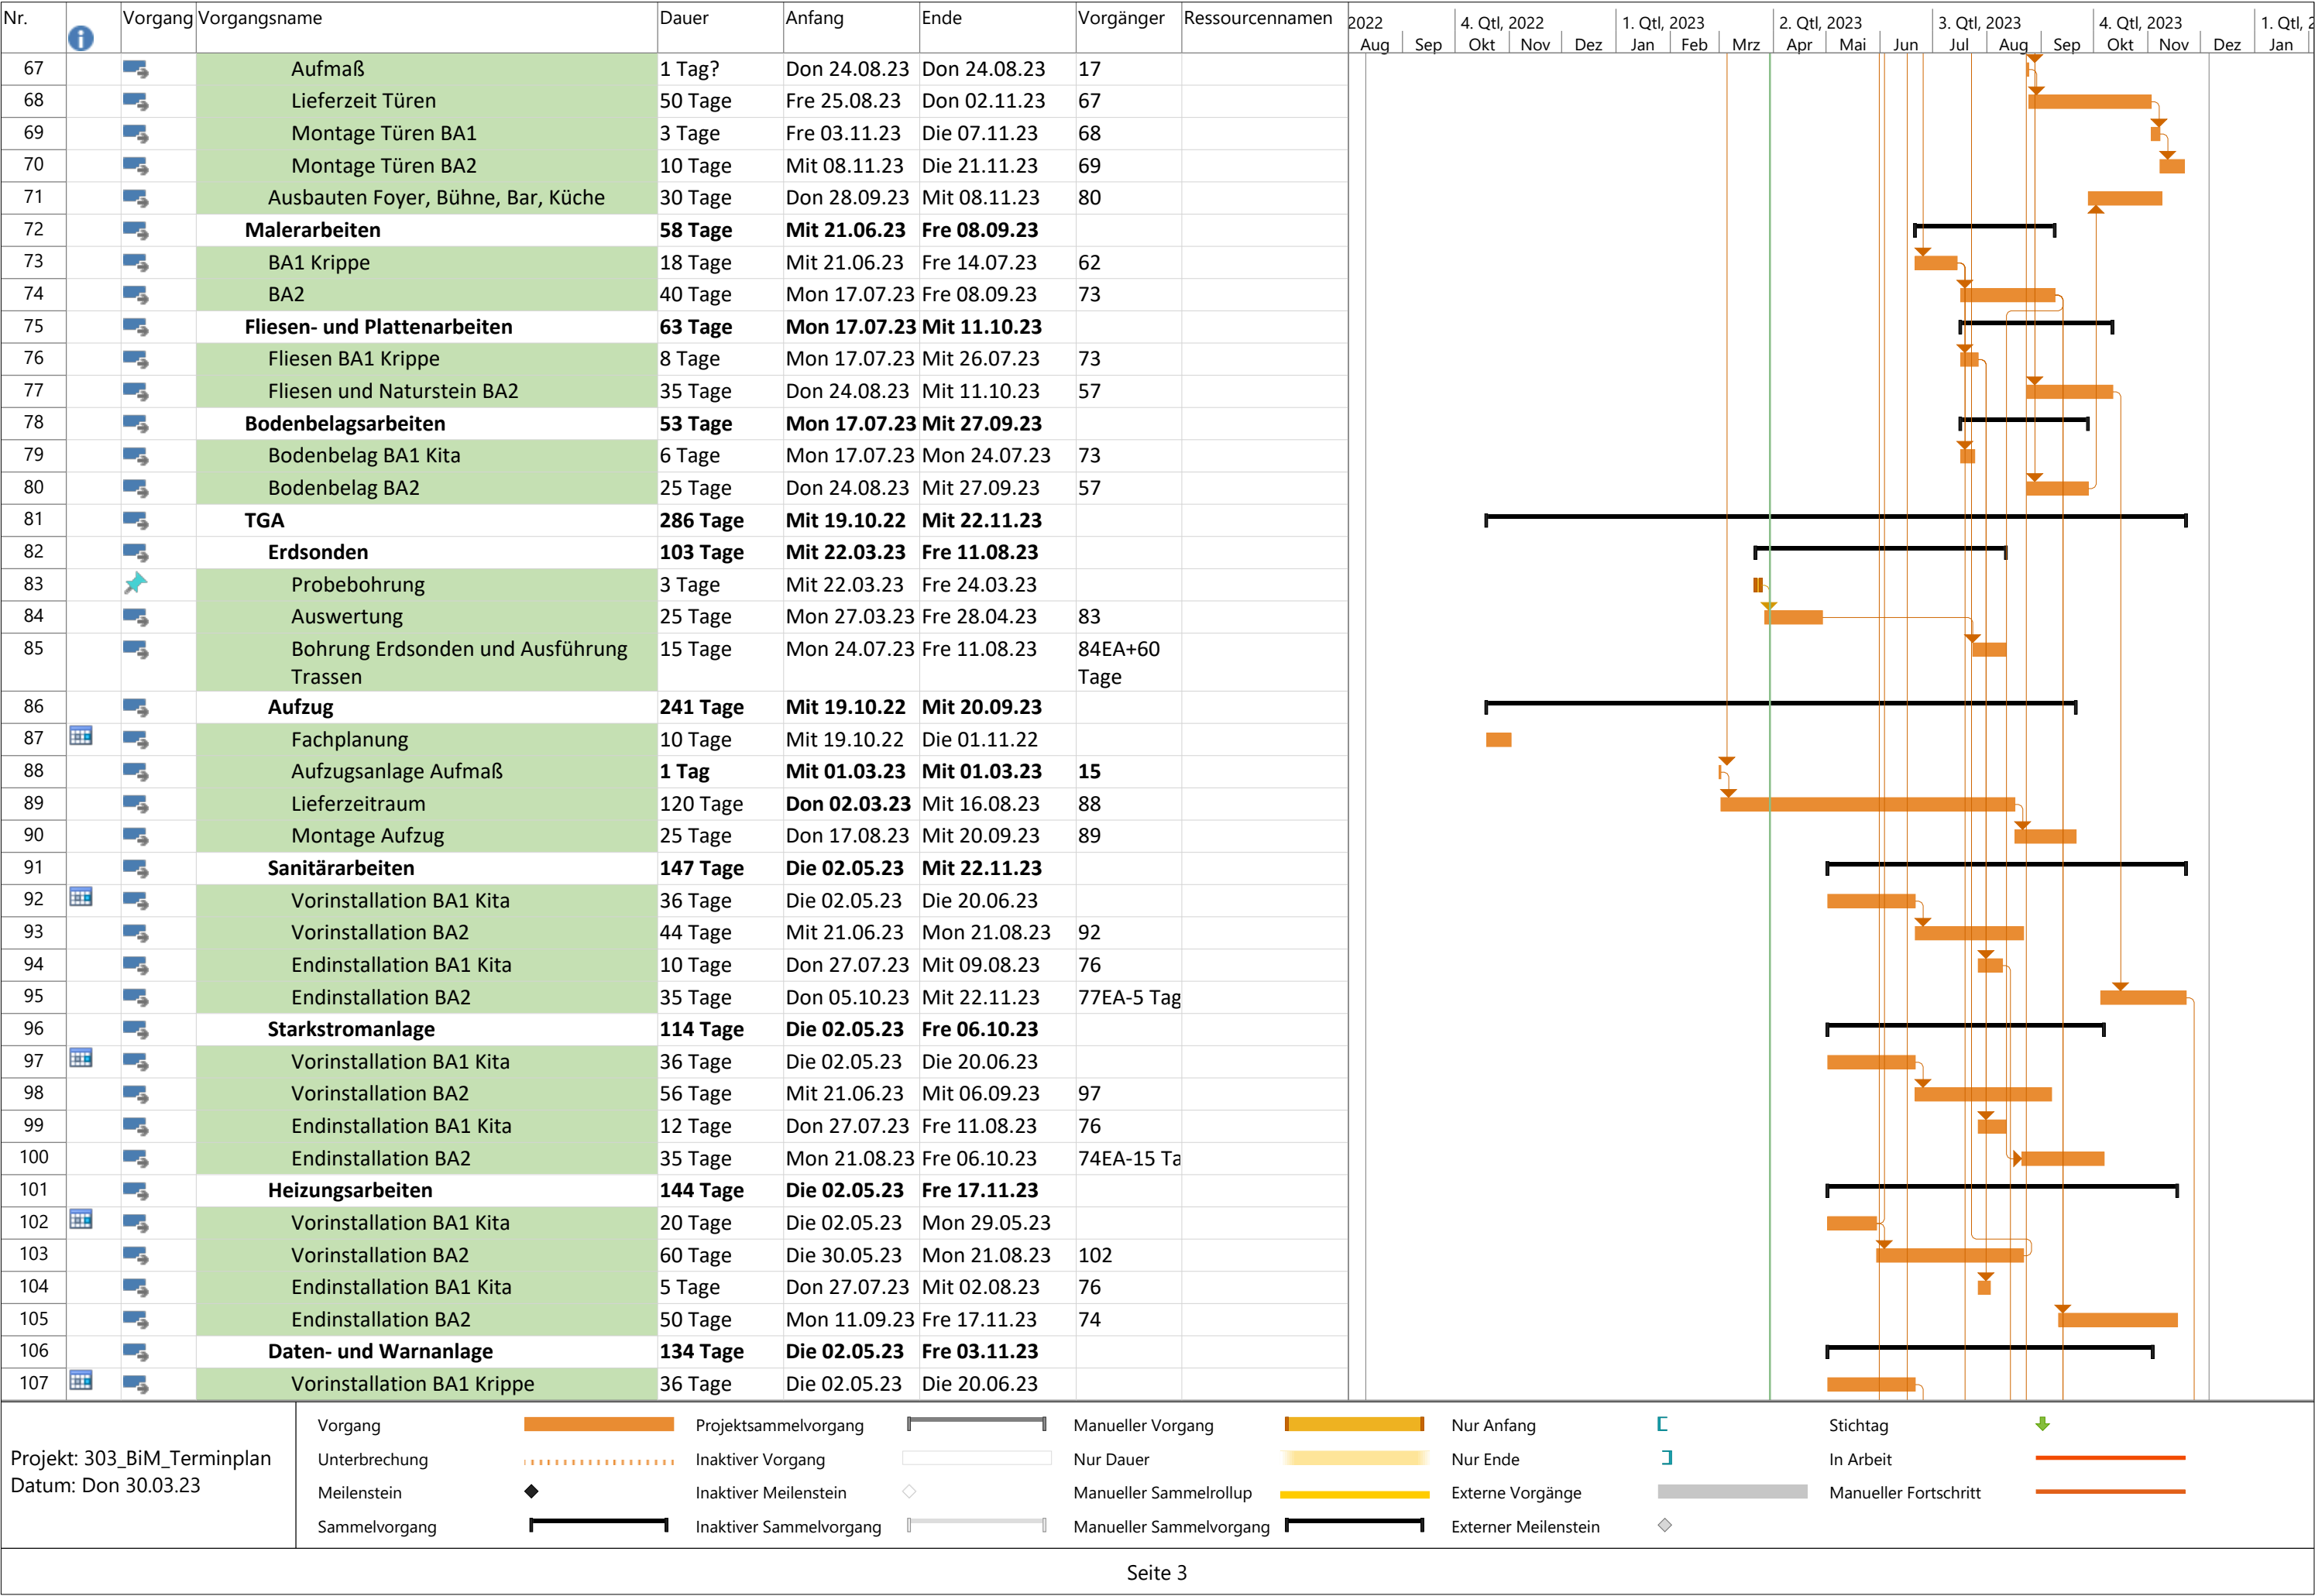





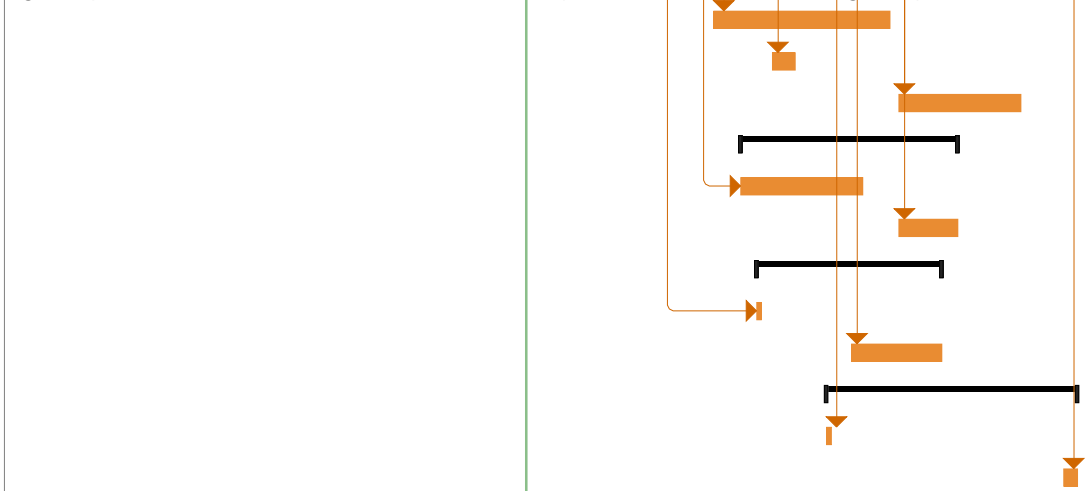


| Nr. |  | Vorgang | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen | 2022 | | | | | 4. Qtl, 2022 | | 1. Qtl, 2023 | | | 2. Qtl, 2023 | | | 3. Qtl, 2023 | | | 4. Qtl, 2023 | | | 1. Qtl, 2024 | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|--|
| | | | | | | | | | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | | |
| 34 | |  | Abdichtung Klempnerei Mittelbau, Neueindecken Altbau | 55 Tage | Mon 05.06.23 | Fre 18.08.23 | 40EA-15 Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | |  | Erdbau | 169 Tage | Die 01.11.22 | Fre 23.06.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 |  |  | Fundamente Treppe außen, Änderung Revisionsschacht bei Treppe | 8 Tage | Die 01.11.22 | Don 10.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | |  | Treppenpodeste, Rampe, Pflasterflächen | 50 Tage | Mon 17.04.23 | Fre 23.06.23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | |  | Zimmermannsarbeiten | 95 Tage | Mon 13.02.23 | Fre 23.06.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 |  |  | Deckenanpassungen Altbau u. Aufzug | 15 Tage | Mon 13.02.23 | Fre 03.03.23 | 13AA+5 Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 |  |  | Dachaufbau und -dämmung | 80 Tage | Mon 06.03.23 | Fre 23.06.23 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | |  | Fenster und Außentüren | 110 Tage | Mon 17.04.23 | Fre 15.09.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 |  |  | Aufmaß, Rückbau Fenster Flur | 1 Tag | Mon 17.04.23 | Mon 17.04.23 | 12EA-31 Ta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | |  | Lieferzeit Fenster und Türen | 74 Tage | Die 18.04.23 | Fre 28.07.23 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | |  | Montage Fenster und Türen Krippe | 5 Tage | Mon 31.07.23 | Fre 04.08.23 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | |  | Montage und Ertüchtigung Fenster und Türen BA2 | 30 Tage | Mon 07.08.23 | Fre 15.09.23 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | |  | Metallbau | 264 Tage | Don 01.12.22 | Die 05.12.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | |  | Außentreppe | 71 Tage | Don 01.12.22 | Don 09.03.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 |  | | Außentreppe OG Aufmaß | 1 Tag | Don 01.12.22 | Don 01.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | |  | Außentreppe Lieferzeit | 60 Tage | Fre 02.12.22 | Don 23.02.23 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | |  | Außentreppe Montage | 10 Tage | Fre 24.02.23 | Don 09.03.23 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | |  | Stahltrappe innen | 45 Tage | Mit 04.10.23 | Die 05.12.23 | 18EA+4 Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | |  | Eingangsportal | 40 Tage | Mon 01.05.23 | Fre 23.06.23 | 37AA+10 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | |  | Estrichbau | 62 Tage | Die 30.05.23 | Mit 23.08.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | |  | Estrich BA1 Kita | 1 Tag | Die 30.05.23 | Die 30.05.23 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | |  | Trocknungszeit Estrich BA1 | 15 Tage | Mit 31.05.23 | Die 20.06.23 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | |  | Estrich BA2 | 2 Tage | Die 01.08.23 | Mit 02.08.23 | 103EA-15 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | |  | Trocknungszeit Estrich BA2 | 15 Tage | Don 03.08.23 | Mit 23.08.23 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 |  |  | Inbetriebnahme BiM - Kinderkrippe, Baubeginn BA2 | 1 Tag? | Fre 11.08.23 | Fre 11.08.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | |  | Ausbau | 286 Tage? | Mit 19.10.22 | Mit 22.11.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | |  | Trockenbauarbeiten | 94 Tage | Mit 26.04.23 | Mon 04.09.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 |  |  | Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wände einseitig | 5 Tage | Mit 26.04.23 | Die 02.05.23 | 31EA+5 Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | |  | Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wände und Decken | 15 Tage | Mit 31.05.23 | Die 20.06.23 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | |  | Trockenbauarbeiten BA2, Wände, Decken UK, Treppenauge | 20 Tage | Mit 21.06.23 | Die 18.07.23 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | |  | Endmontage Decken BA2 | 12 Tage | Fre 18.08.23 | Mon 04.09.23 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | |  | Tischlerarbeiten | 64 Tage? | Don 24.08.23 | Die 21.11.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | |  | Innentüren | 64 Tage? | Don 24.08.23 | Die 21.11.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|---|
| Projekt: 303_BiM_Terminplan Datum: Don 30.03.23 | Vorgang |  | Projektsammelvorgang |  | Manueller Vorgang |  | Nur Anfang |  | Stichtag |  |
| | Unterbrechung |  | Inaktiver Vorgang |  | Nur Dauer |  | Nur Ende |  | In Arbeit |  |
| | Meilenstein |  | Inaktiver Meilenstein |  | Manueller Sammelrollup |  | Externe Vorgänge |  | Manueller Fortschritt |  |
| | Sammelvorgang |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Manueller Sammelvorgang |  | Externer Meilenstein |  | | |



Seite 3

| Nr. |  | Vorgang | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen | 2022 | | 4. Qtl, 2022 | | 1. Qtl, 2023 | | | 2. Qtl, 2023 | | 3. Qtl, 2023 | | 4. Qtl, 2023 | | 1. Qtl, 2024 | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------------|---------|--------------|--------------|------------|-----------------|------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|---|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | | | |
| 108 | |  | Vorinstallation BA2 | 56 Tage | Mit 21.06.23 | Mit 06.09.23 | 107 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 109 | |  | Endinstallation BA1 Kita | 8 Tage | Mon 17.07.23 | Mit 26.07.23 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | |  | Endinstallation BA2 | 40 Tage | Mon 11.09.23 | Fre 03.11.23 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | |  | Lüftungsanlage Saal | 70 Tage | Mon 03.07.23 | Fre 06.10.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | |  | Vorinstallation | 40 Tage | Mon 03.07.23 | Fre 25.08.23 | 63AA+8 Ta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | |  | Endinstallation | 20 Tage | Mon 11.09.23 | Fre 06.10.23 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | |  | Photovoltaik | 60 Tage | Mon 10.07.23 | Fre 29.09.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | |  | Montage Halter Satteldach | 2 Tage | Mon 10.07.23 | Die 11.07.23 | 34AA+25 T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | |  | Montage PV Module | 30 Tage | Mon 21.08.23 | Fre 29.09.23 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | |  | Baureinigung | 79 Tage | Don 10.08.23 | Die 28.11.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | |  | Baureinigung BA1 | 2 Tage | Don 10.08.23 | Fre 11.08.23 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | |  | Baureinigung BA2 | 4 Tage | Don 23.11.23 | Die 28.11.23 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Projekt: 303_BiM_Terminplan
Datum: Don 30.03.23


Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang









Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang


Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang










Manueller Vorgang


Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang











Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein









Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

