










































































Nr.		Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	2022					1. Qtl, 2023			2. Qtl, 2023			3. Qtl, 2023			4. Qtl, 2023			1. Qtl, 2024		
									Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	
1			Prüfung Statk	30 Tage	Don 11.08.22	Mit 21.09.22																						
2			Baubeginn BA1	320 Tage?	Mit 14.09.22	Die 05.12.23																						
3			Baustelleneinrichtung	58 Tage	Mit 14.09.22	Fre 02.12.22																						
4			Bauzaun, Baustrom/-Wasser, Bau WC	16 Tage	Mit 14.09.22	Mit 05.10.22																						
5			Gerüstbau	14 Tage	Die 15.11.22	Fre 02.12.22																						
6			Abrüsten	4 Tage	Die 13.06.23	Fre 16.06.23	34EA+5 Tag																					
7			Rohbau	286 Tage	Die 01.11.22	Die 05.12.23																						
8			Rückbau / Entkernung	30 Tage	Die 01.11.22	Mon 12.12.22																						
9			Rückbauarbeiten: Bodenbeläge, Wandbeläge, Einbauten, Türen etc.	5 Tage	Die 01.11.22	Mon 07.11.22																						
10			Abbrucharbeiten	25 Tage	Die 08.11.22	Mon 12.12.22	9																					
11			Maurer- / Betonbau	230 Tage	Don 08.12.22	Mit 25.10.23																						
12			Punkt- und Streifenfundamente Nachgründungen, Abfangungsmaßnahmen Saal, Anpassung Grundleitungen, Neuaufbau Sohle Kita, Fassadenpfeiler Kita	100 Tage	Don 08.12.22	Mit 26.04.23	8EA-3 Tage;36EA-Tage																					
13			Trocknungszeit Sohlplatte BA1 Kita	26 Tage	Mon 06.02.23	Mon 13.03.23																						
14			Rückbau und Neuaufbau Sohlplatten Saal und Bar,	60 Tage	Don 27.04.23	Mit 19.07.23	12																					
15			Ausführung Aufzugsschacht	12 Tage	Mon 13.02.23	Die 28.02.23																						
16			Trocknungszeit Sohlplatte BA2	22 Tage	Don 20.04.23	Fre 19.05.23																						
17			Türdurchbrüche, Grundrissänderung	25 Tage	Don 20.07.23	Mit 23.08.23	14																					
18			Neuerstellung Treppe HM 1.OG	25 Tage	Don 24.08.23	Mit 27.09.23	17																					
19			Fassadenreparatur, Mauerwerksaustausch	20 Tage	Don 28.09.23	Mit 25.10.23	18																					
20			Bauwerksabdichtung	102 Tage	Mon 03.04.23	Die 22.08.23																						
21			Horizontalsperren	10 Tage	Fre 26.05.23	Don 08.06.23	16EA+4 Tag																					
22			Sanierputz nur BA2	14 Tage	Don 03.08.23	Die 22.08.23	56																					
23			Dichtschlämme Außen	10 Tage	Mon 03.04.23	Fre 14.04.23																						
24			Dämmarbeiten Außenwände	97 Tage	Mit 05.04.23	Don 17.08.23																						
25			Innendämmung Außenwände	97 Tage	Mit 05.04.23	Don 17.08.23																						
26			Wandvorbereitung und Innendämmung BA1 Kita	27 Tage	Mit 05.04.23	Don 11.05.23	31EA-10 Tage																					
27			Wandvorbereitung und Innendämmung BA2	70 Tage	Fre 12.05.23	Don 17.08.23	26																					
28			WDVS Anbau WC	21 Tage	Die 16.05.23	Die 13.06.23	33																					
29			Ausblasdämmung	8 Tage	Die 18.04.23	Don 27.04.23	42																					
30			Dachdeckerarbeiten	91 Tage	Fre 14.04.23	Fre 18.08.23																						
31			Abdichtung Sohlplatten BA 1 Krippe	3 Tage	Fre 14.04.23	Die 18.04.23																						
32			Abdichtung Sohlplatten BA 2	8 Tage	Mon 22.05.23	Mit 31.05.23	16																					
33			Dachsanierung WC-Anbau	21 Tage	Mon 17.04.23	Mon 15.05.23																						

Projekt: 303_BiM_Terminplan
Datum: Don 30.03.23

Vorgang



Projektsammelvorgang



Manueller Vorgang



Nur Anfang



Stichtag



Unterbrechung



Inaktiver Vorgang



Nur Dauer



Nur Ende



In Arbeit



Meilenstein



Inaktiver Meilenstein



Manueller Sammelrollup



Externe Vorgänge



Manueller Fortschritt



Sammelvorgang



Inaktiver Sammelvorgang



Manueller Sammelvorgang



Externer Meilenstein



Nr.		Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	2022	Aug	Sep	4. Qtl, 2022	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2023	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2023	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2023	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2023	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2024	Jan
34			Abdichtung Klempnerei Mittelbau, Neueindecken Altbau	55 Tage	Mon 05.06.23	Fre 18.08.23	40EA-15 Tage																										
35			Erdbau	169 Tage	Die 01.11.22	Fre 23.06.23																											
36			Fundamente Treppe außen, Änderung Revisionsschacht bei Treppe	8 Tage	Die 01.11.22	Don 10.11.22																											
37			Treppenpodeste, Rampe, Pflasterflächen	50 Tage	Mon 17.04.23	Fre 23.06.23	23																										
38			Zimmermannsarbeiten	95 Tage	Mon 13.02.23	Fre 23.06.23																											
39			Deckenanpassungen Altbau u. Aufzug	15 Tage	Mon 13.02.23	Fre 03.03.23	13AA+5 Tage																										
40			Dachaufbau und -dämmung	80 Tage	Mon 06.03.23	Fre 23.06.23	39																										
41			Fenster und Außentüren	110 Tage	Mon 17.04.23	Fre 15.09.23																											
42			Aufmaß, Rückbau Fenster Flur	1 Tag	Mon 17.04.23	Mon 17.04.23	12EA-31 Ta																										
43			Lieferzeit Fenster und Türen	74 Tage	Die 18.04.23	Fre 28.07.23	42																										
44			Montage Fenster und Türen Krippe	5 Tage	Mon 31.07.23	Fre 04.08.23	43																										
45			Montage und Ertüchtigung Fenster und Türen BA2	30 Tage	Mon 07.08.23	Fre 15.09.23	44																										
46			Metallbau	264 Tage	Don 01.12.22	Die 05.12.23																											
47			Außentreppe	71 Tage	Don 01.12.22	Don 09.03.23																											
48			Außentreppe OG Aufmaß	1 Tag	Don 01.12.22	Don 01.12.22																											
49			Außentreppe Lieferzeit	60 Tage	Fre 02.12.22	Don 23.02.23	48																										
50			Außentreppe Montage	10 Tage	Fre 24.02.23	Don 09.03.23	49																										
51			Stahltreppe innen	45 Tage	Mit 04.10.23	Die 05.12.23	18EA+4 Tag																										
52			Eingangsportal	40 Tage	Mon 01.05.23	Fre 23.06.23	37AA+10 T																										
53			Estrichbau	62 Tage	Die 30.05.23	Mit 23.08.23																											
54			Estrich BA1 Kita	1 Tag	Die 30.05.23	Die 30.05.23	102																										
55			Trocknungszeit Estrich BA1	15 Tage	Mit 31.05.23	Die 20.06.23	54																										
56			Estrich BA2	2 Tage	Die 01.08.23	Mit 02.08.23	103EA-15 T																										
57			Trocknungszeit Estrich BA2	15 Tage	Don 03.08.23	Mit 23.08.23	56																										
58			Inbetriebsname BiM - Kinderkrippe, Baubeginn BA2	1 Tag?	Fre 11.08.23	Fre 11.08.23																											
59			Ausbau	286 Tage?	Mit 19.10.22	Mit 22.11.23																											
60			Trockenbauarbeiten	94 Tage	Mit 26.04.23	Mon 04.09.23																											
61			Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wände einseitig	5 Tage	Mit 26.04.23	Die 02.05.23	31EA+5 Tage																										
62			Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wände und Decken	15 Tage	Mit 31.05.23	Die 20.06.23	54																										
63			Trockenbauarbeiten BA2, Wände, Decken UK, Treppenauge	20 Tage	Mit 21.06.23	Die 18.07.23	62																										
64			Endmontage Decken BA2	12 Tage	Fre 18.08.23	Mon 04.09.23	27																										
65			Tischlerarbeiten	64 Tage?	Don 24.08.23	Die 21.11.23																											
66			Innentüren	64 Tage?	Don 24.08.23	Die 21.11.23																											

Projekt: 303_BiM_Terminplan
Datum: Don 30.03.23

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende


Externe Vorgänge










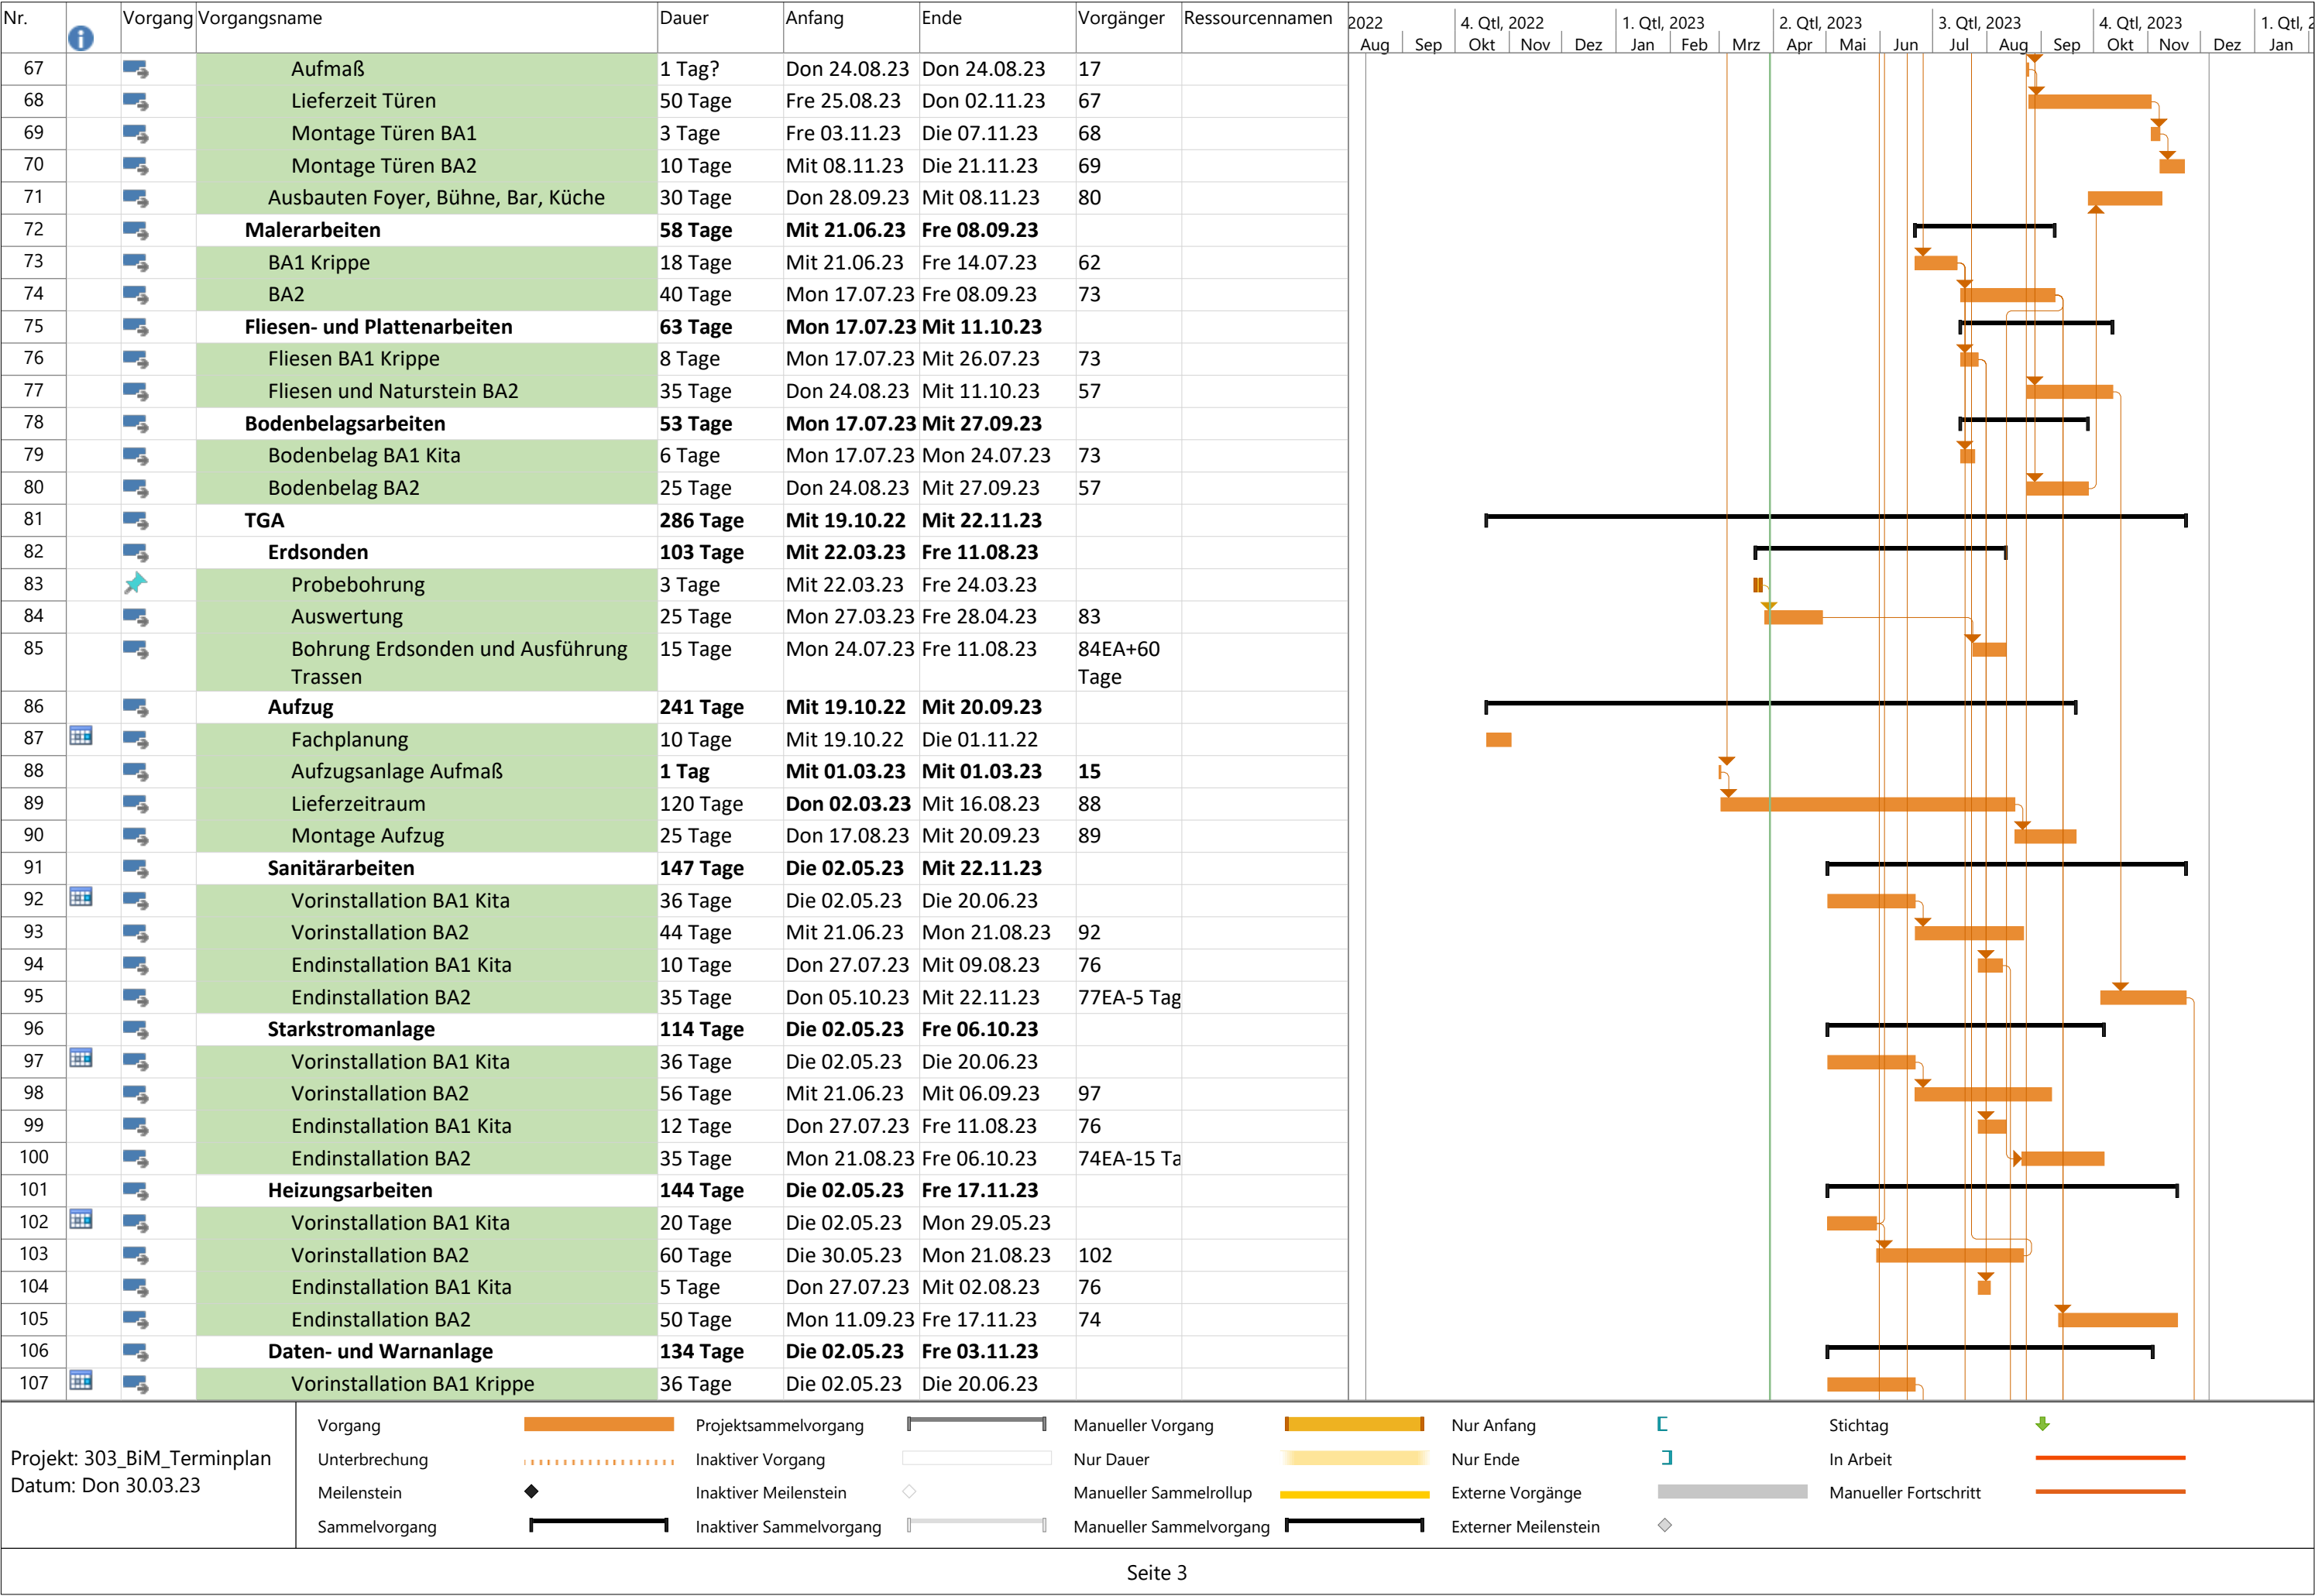

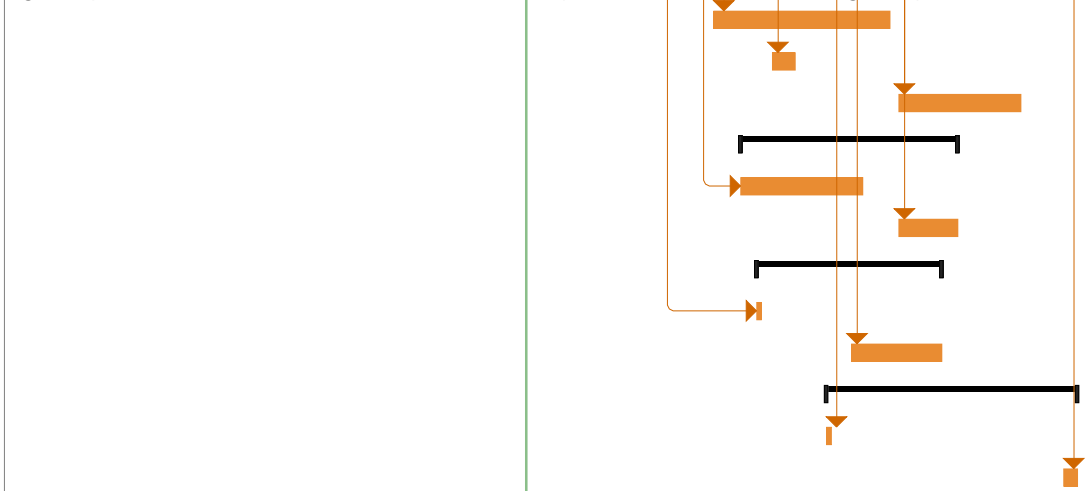

Externer Meilenstein

Stichtag
















In Arbeit

Manueller Fortschritt



Nr.		Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	2022			4. Qtl, 2022			1. Qtl, 2023			2. Qtl, 2023			3. Qtl, 2023			4. Qtl, 2023			1. Qtl, 2024	
									Aug	Sep		Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb
108			Vorinstallation BA2	56 Tage	Mit 21.06.23	Mit 06.09.23	107																					
109			Endinstallation BA1 Kita	8 Tage	Mon 17.07.23	Mit 26.07.23	73																					
110			Endinstallation BA2	40 Tage	Mon 11.09.23	Fre 03.11.23	74																					
111			Lüftungsanlage Saal	70 Tage	Mon 03.07.23	Fre 06.10.23																						
112			Vorinstallation	40 Tage	Mon 03.07.23	Fre 25.08.23	63AA+8 Tag																					
113			Endinstallation	20 Tage	Mon 11.09.23	Fre 06.10.23	74																					
114			Photovoltaik	60 Tage	Mon 10.07.23	Fre 29.09.23																						
115			Montage Halter Satteldach	2 Tage	Mon 10.07.23	Die 11.07.23	34AA+25 Tag																					
116			Montage PV Module	30 Tage	Mon 21.08.23	Fre 29.09.23	34																					
117			Baureinigung	79 Tage	Don 10.08.23	Die 28.11.23																						
118			Baureinigung BA1	2 Tage	Don 10.08.23	Fre 11.08.23	94																					
119			Baureinigung BA2	4 Tage	Don 23.11.23	Die 28.11.23	95																					



Projekt: 303_BiM_Terminplan Datum: Don 30.03.23	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			
